



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt



Vorinformation

Daniela Keller, Projektleiterin, Projektieren und Realisieren
Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Telefon 043 259 55 66, Mail pr.tba@bd.zh.ch, www.zh.ch/tba



SBB CFF FFS

wetzikon

Wetzikon, im September 2025

Wetzikon: Bauarbeiten für den Ersatz der Bahnbrücke über die Usterstrasse haben begonnen

Sehr geehrte Damen und Herren

Die bestehende 113-jährige Bahnbrücke über die Usterstrasse weist einen schadhaften baulichen Zustand auf. Die Stahlbrücke wird den zukünftigen Beanspruchungen nicht mehr genügen. Zudem plant der Kanton Zürich, dereinst die Usterstrasse zugunsten der Sicherheit für den Velo- und Fussverkehr zu verbreitern. Deshalb ersetzen die SBB nächstes Jahr in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt die SBB-Überführung.

Die Bauarbeiten finden in vier Phasen statt:

Bauphase 0 von Mitte September bis Ende Oktober 2025

Einrichtung des Installationsplatzes zwischen der Sporthalle der Berufsschule und dem Bahngleis. Die Arbeiten finden tagsüber ohne wesentliche Verkehrseinschränkungen statt.

Bauphase 1 von Anfang Februar bis Mitte Juli 2026

Die Bauteile der Brücke werden auf dem Installationsplatz vorfabriziert. Aus sicherheitsrelevanten Gründen (Nähe zur Fahrleitung und zu den fahrenden Zügen) müssen wir in den Zeiträumen vom 15. bis 19. Juni 2026 sowie vom 6. bis 10. Juli 2026 Arbeiten in der Nacht bei ausgeschalteter Fahrleitung ausführen. Dabei wird auch die Usterstrasse jeweils zwischen 20:00 und 05:00 Uhr im Bereich der Brücke gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert.

Bauphase 2 vom 10. Juli bis zum 3. August 2026

Die bestehende Brücke wird abgebrochen und die Bauteile der neuen Brücke werden mit einem Raupenkran eingehoben. Diese Arbeiten müssen während einer dreiwöchigen Intensivbauphase vom 10. Juli bis zum 3. August 2026 durchgeführt werden, während der grundsätzlich durchgehend gearbeitet wird (auch in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen).

In diesem Zeitraum ist die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Wetzikon und Kempten unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse.



Ebenso ist die Usterstrasse zwischen dem Kreisel Weststrasse und der Einmündung Talstrasse vom 10. Juli bis zum 3. August 2026 komplett gesperrt. Der Strassenverkehr wird über die Weststrasse, die Binzackerstrasse und die Motorenstrasse umgeleitet (siehe Pläne auf der nächsten Seite). Der Fussgänger- und Veloverkehr wird einerseits über die Talstrasse und die Weststrasse sowie andererseits über die Strandbadstrasse, die Elisabethenstrasse und die Weststrasse umgeleitet. Der Schwerverkehr wird grossräumig umgeleitet. Die Buslinie 852 verkehrt über die Weststrasse anstelle der Bahnhofstrasse.



Eine Übersicht aller kantonalen Strassenbaustellen finden Sie unter www.zh.ch/strassenbaustellen



Verkehrsführung vom 10. Juli bis 3. August 2026

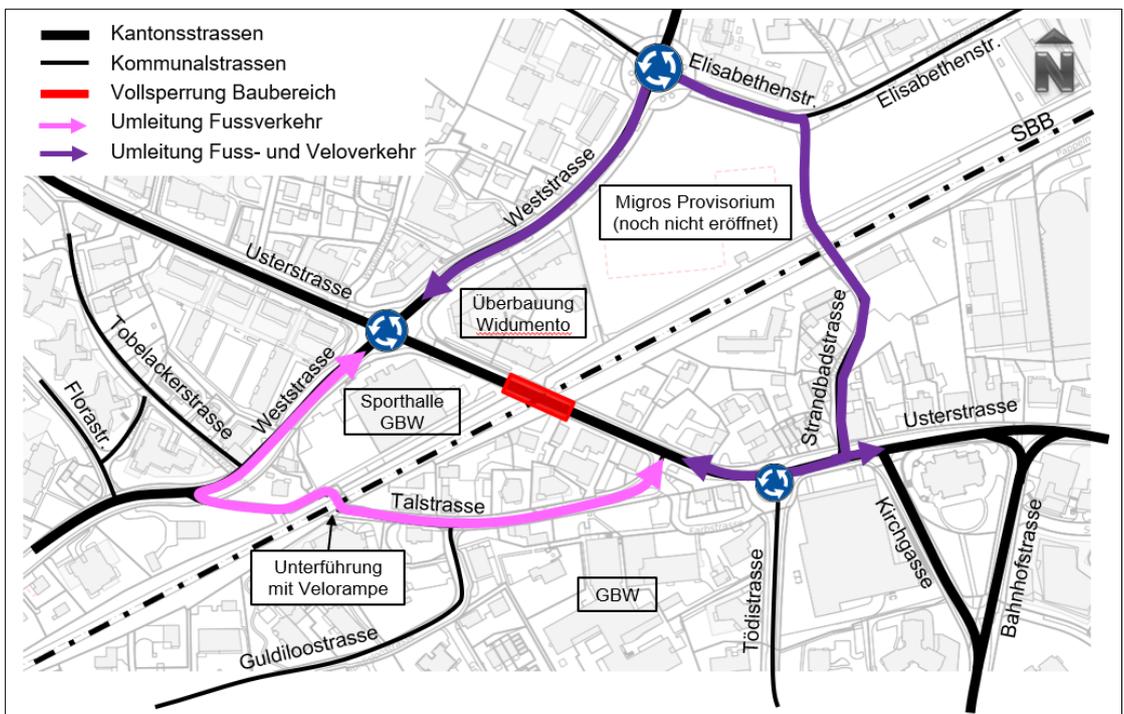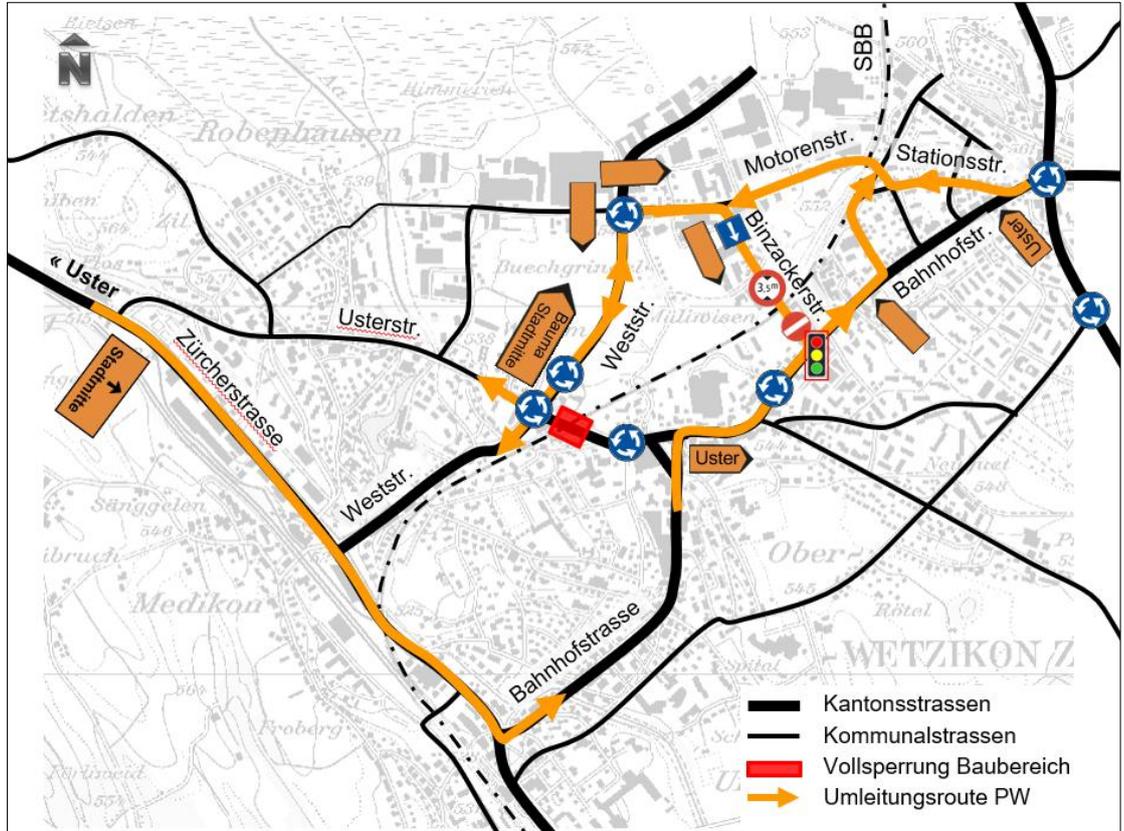



Bauphase 3 vom 3. August 2026 bis Oktober 2026

Während der letzten Bauphase werden Gleisbau- und Abschlussarbeiten ausgeführt. Aus sicherheitsrelevanten Gründen müssen wir in den Zeiträumen vom 3. bis 6. August 2026 sowie vom 10. bis 13. August 2026 Arbeiten in der Nacht bei ausgeschalteter Fahrleitung ausführen. In dieser Bauphase sind keine Verkehrseinschränkungen auf der Usterstrasse geplant.

Wir werden Sie während des gesamten Projekts regelmässig über die anstehenden Arbeiten informieren und setzen alles daran, die unumgänglichen Lärmemissionen und Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten. Wir danken für Ihr Verständnis. Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Tiefbauamt

Projektieren und
Realisieren

Stadt Wetzikon

Tiefbau

SBB AG

Infrastruktur
Projektmanagement

Daniela Keller
Projektleiterin

Dario Erismann
Abteilungsleiter Tiefbau

Lucian Toller
Gesamtprojektleiter



und Fussverkehr verbreitert.





Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA



**Achten Sie auf
unsere Sicherheit!**
